INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA - MAYO

Fecha:	25 DE MAYO DE 2026
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y LICENCIAMIENTO SAAS
Objeto del Contrato:	CONSULTORÍA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, DESFRAGMENTACIÓN DE PROCESOS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ECOSISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OPTIMIZACIÓN OPERATIVA HACIA EL MODELO DE "CERO PAPEL" Y GESTIÓN ATÓMICA INSTITUCIONAL.
Contratista	
Nombre:	CLOUD CITY COLOMBIA SAS
Nit:	901249716-3
Tel:	(601) 656-4021 - 3182011697
Email:	administrativo@cloudcity.com.co
Contratante:	DIBANKA

Presentación de Informe de Contratista	
Contratista: CLOUD CITY COLOMBIA SAS	
Fecha de inicio: 11 de mayo de 2026	
Periodo reportado:	MAYO

1. INTRODUCCIÓN Y DATOS DEL PROYECTO

De conformidad con el Acta de Inicio suscrita el 13 de mayo de 2026, el presente documento constituye el primer informe mensual de ejecución, dando cumplimiento a la Obligación 8 del Contratista (Cláusula 4), la cual establece la presentación de reportes de avance y cumplimiento de hitos como requisito indispensable para la facturación. Este informe detalla el cumplimiento al 100% de la Fase I: Diagnóstico (Consultoría, análisis profundo e identificación de procesos mejorables) correspondiente al mes de mayo

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CLÁUSULA 4)

A. Obligaciones 1 y 2: Ejecución de la Consultoría y Diagnóstico Detallado

Como hito central de este periodo, se llevó a cabo la reunión oficial de diagnóstico y levantamiento de requerimientos con el supervisor del apoyo técnico de CASUR. En este espacio, se discutieron las funcionalidades del sistema y la nueva reestructuración de las subdirecciones (se adjunta evidencia fotográfica de la reunión):



Durante la sesión, se estableció la ruta de acción operativa y se identificó a los líderes de dependencias clave para la integración tecnológica:

- Subdirectora Administrativa / Secretaria General: Coronel Ximena.
- Gestión Documental: Alejandra Vaca.
- PQRSD (Grupo de Relacionamientos): Liliana Suárez.
- CITSE: Liliana López.
- Jefe Subdirección Prestaciones Sociales: Doctor Alirio Choconta.

Hallazgos Operativos y Directrices de la Supervisión:

1. **Enfoque en 4 Trámites Misionales:** Se diagnosticó que la entidad concentra su carga operativa actual en cuatro trámites principales que serán el núcleo de la automatización:

    - Actualización de la asignación
    - Reconocimiento de la sustitución
    - Actualización de la sustitución
    - Acreedores varios

2. **Ruta de Implementación (Prioridad Gestión Documental):** Por sugerencia directa del supervisor técnico, se concluyó que el despliegue del software debe iniciar obligatoriamente por el área de Archivo y Gestión Documental, bajo el liderazgo de Alejandra Vaca. La directriz técnica es realizar una investigación exhaustiva de cómo se maneja actualmente el gestor documental para replicar e instaurar el mismo flujo en el nuevo sistema SGDEA, garantizando que no haya un impacto negativo o traumatismo ("trascendencia") en la curva de adopción de los usuarios de la entidad.

3. **Integración de Bienestar y Atención Integral:** Se determinó que el Grupo de Bienestar y Atención al Afiliado (que articula con veteranos, Emisora, Casur Education, entre otros) tendrá un rol de consumidor de datos del CRM para potenciar sus servicios.

B. Obligación 3: Despliegue de Arquitectura y Agentes IA

En paralelo al diagnóstico, se desplegó la arquitectura técnica base del "Casur 360", integrando el backend (Node.js + Express 5), el frontend (React 19) y las bases de datos (MariaDB y Neo4j). Se configuró el catálogo inicial de la Fuerza Laboral Digital, teniendo ya operativos en ambiente de pruebas los cimientos de los Agentes.

C. Obligaciones 4, 6 y 7: Disponibilidad SaaS, Confidencialidad y Seguridad

Se garantiza la cobertura 24/7 mediante el gestor PM2 en infraestructura propia de Cloud City. Para dar estricto cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, se estableció que todos los modelos de IA se ejecutan on-premise en los servidores del contratista, impidiendo que la información sensible de los veteranos salga hacia proveedores de nube externos. Además, se configuró un modelo de seguridad basado en permisos atómicos (ej. RADICACION.CREAR) para restringir el acceso según el rol.

3. AVANCE TÉCNICO ALINEADO AL DIAGNÓSTICO DE LA FASE 1

En respuesta a la conclusión de la mesa de trabajo sobre replicar el modelo del gestor documental actual, el equipo de ingeniería avanzó proactivamente en los siguientes desarrollos durante el mes de mayo:

- **Integración de Sistemas Legados:** Se estructuró la conexión del nuevo CRM con el sistema Oracle Gestor Documental (CD_PROD) actual. Esto permitirá extraer el histórico de radicación y mapear las rutas de los trámites existentes para replicarlos fielmente en el nuevo SGDEA.
- **Digitalización Técnica (TRD):** Se implementó el módulo de la Tabla de Retención Documental (TRD) con series, subseries y tipologías. Este módulo está listo para ser parametrizado junto con la líder de Gestión Documental (Alejandra Vaca) para reflejar las oficinas productoras y unidades administrativas idénticas a la realidad de CASUR.

- **Consolidación de Datos Atómicos:** Se sentaron las bases para que áreas como Bienestar (Emisora, Educación) puedan consumir los datos perfilados de los veteranos. Se desarrolló la vista que unifica la identidad del afiliado cruzando la base de datos de Oracle Nómina 10g con los registros de la entidad.

- **Canales Unificados:** Se habilitó el Inbox de email integrado (IMAP/SMTP) que convierte correos en radicados, y se avanzó en la configuración del portal público de PQRSDF, que estará alineado con el equipo de Liliana Suárez.

4. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS (JUNIO):

Hito de Mayo Alcanzado: El periodo cierra con el diagnóstico institucional culminado y las rutas de trabajo debidamente aprobadas por la supervisión de apoyo técnico. El rediseño de prioridades y el reconocimiento del organigrama (Coronel Ximena, Alejandra Vaca, Liliana Suárez, Liliana López y Dr. Alirio Choconta) garantiza una implementación precisa y sin fricciones. Por lo anterior, se certifica el 100% de cumplimiento de la fase estipulada para mayo, habilitando el pago correspondiente de COP $40.000.000.

Próximos Pasos: Durante la primera semana de junio, el equipo consultor ejecutará mesas de trabajo exclusivas con Alejandra Vaca (Gestión Documental) para documentar a profundidad los

flujos lógicos de los 4 trámites principales identificados. Inmediatamente después, se parametrizará el motor de automatizaciones del CASUR CRM 360 IA para reflejar estas rutas, dando inicio formal al uso del sistema en ambiente de producción controlada.

5. ANEXOS Y EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO (FASE 1 - MAYO)

Para dar soporte técnico, operativo y documental a las actividades reportadas durante el periodo del 13 al 31 de mayo de 2026, se adjuntan al presente informe los siguientes documentos y evidencias de validación con la supervisión de Apoyo Técnico de CASUR:

ANEXO 1: ***Informe de Diseño e Implementación CRM*** - Documento técnico detallado que evidencia la construcción de la plataforma base "Casur 360", abarcando las siguientes etapas superadas durante el periodo:

Actividad: Desarrollo de soluciones

- Diseño e implementación de soluciones (Arquitectura Monorepo Node.js/React).
- Optimización de flujos operacionales.
- Desarrollo de funcionalidades (Gestión atómica y expedientes).
- Integración de Inteligencia Artificial (Despliegue del motor LLM on-premise).
- Configuración del CRM IA

Actividad: Ajustes y pruebas

- Finalizar desarrollo del núcleo funcional.
- Ejecución de pruebas internas de rendimiento y seguridad.
- Documentación técnica de la plataforma.
- Preparación de la entrega preliminar en entorno UAT.
- Digitalización hacia el modelo "Cero Papel" (Módulo TRD y firmas)

.

ANEXO 2: Documento de Instrumentos para Levantamiento de Información (PDF) - Documento metodológico consolidado que relaciona toda la documentación, el alcance deseado y la manera de implementar las sesiones de trabajo de campo con los diferentes actores y personal operativo de CASUR.

ANEXO 3: Kit de Instrumentos de Levantamiento (Archivo Excel) Archivo matriz que contiene las 19 planillas y formatos estructurados para el trabajo de campo, incluyendo diccionarios de datos, fichas de procesos, matrices de pain points, mapeo origen-destino y el paso a paso para diligenciar cada uno de los formatos durante las sesiones.

ANEXO 4: Solicitud de Aprobación de Sesiones Documento formal (SOLICITUD DE APROBACIÓN SESIONES.pdf) remitido al Apoyo Técnico detallando los rangos semanales y las sesiones a abordar con los líderes de las dependencias (específicamente iniciando con Gestión Documental) para obtener las autorizaciones y espacios pertinentes.

ANEXO 5: Solicitud de Aprobación de Cronograma de Mayo Documento formal (Solicitud-Aprobacion-Cronograma-Mayo-2026.pdf) que contiene la modificación y el reajuste del cronograma operativo de mayo, solicitado tras el análisis y las modificaciones requeridas por el Apoyo Técnico de CASUR para garantizar un arranque escalonado y sin fricciones.


ANEXO 6: Solicitud de Aprobación del Kit de Instrumentos Documento formal (SOLICITUD DE APROBACIÓN KIT INSTRUMENTOS.pdf) remitido al Apoyo Técnico para el análisis, revisión

metodológica y aprobación final de las herramientas de recolección de datos antes de su aplicación con los funcionarios de la entidad.

EVIDENCIAS DE RADICACIÓN Y GESTIÓN CON APOYO TÉCNICO DE CASUR

A continuación, se anexan las evidencias de envío de la documentación previamente listada al Apoyo Técnico de CASUR para su correspondiente revisión y aprobación:

Evidencia 1: Envío de Solicitud de Aprobación de Cronograma y Sesiones (En este espacio se evidencia la remisión formal de los Anexos 4 y 5 al equipo de apoyo técnico de la entidad para organizar la agenda de levantamiento).

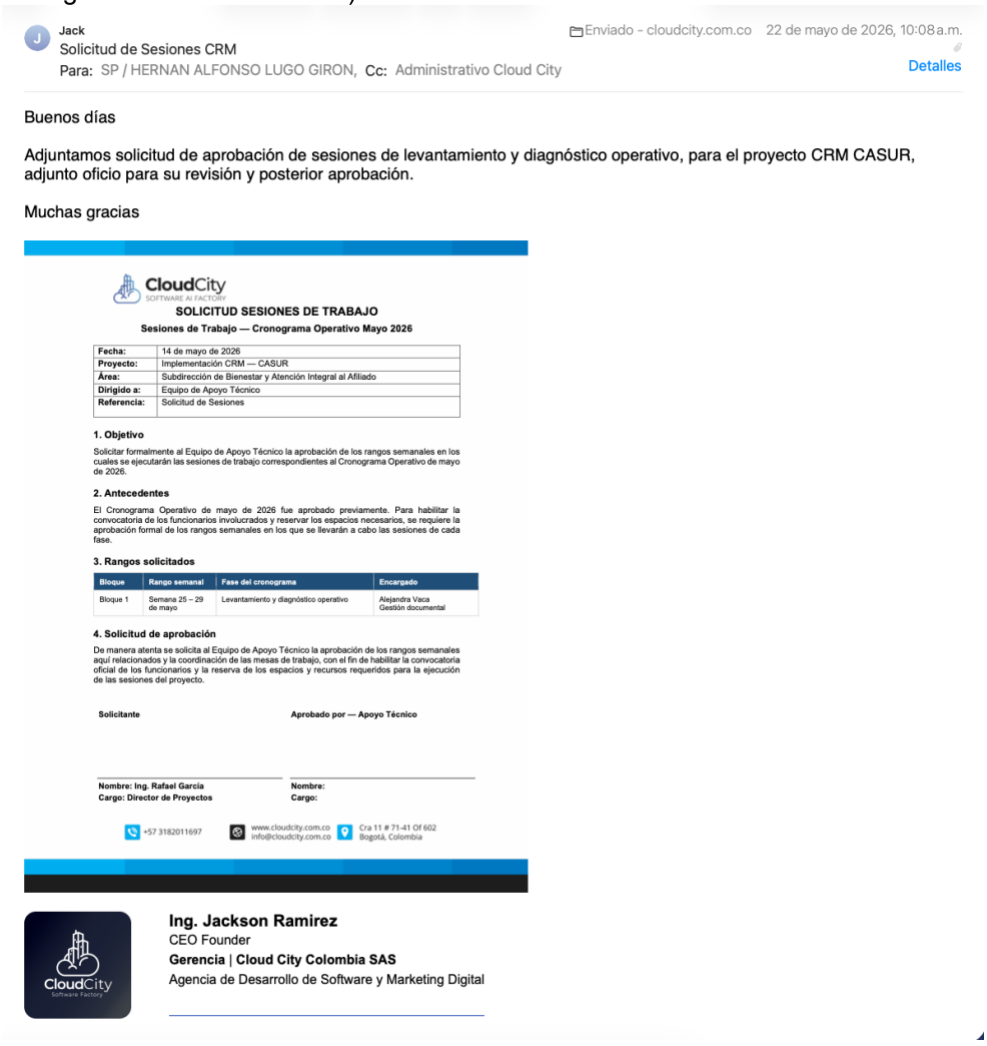

Jack
Solicitud de Sesiones CRM
Para: SP / HERNAN ALFONSO LUGO GIRON, Cc: Administrativo Cloud City
Enviado - cloudcity.com.co 22 de mayo de 2026, 10:08 a.m.
Detalles

Buenos días

Adjuntamos solicitud de aprobación de sesiones de levantamiento y diagnóstico operativo, para el proyecto CRM CASUR, adjunto oficio para su revisión y posterior aprobación.

Muchas gracias

CloudCity
SOFTWARE AI FACTORY

SOLICITUD SESIONES DE TRABAJO

Sesiones de Trabajo — Cronograma Operativo Mayo 2026

Fecha:	14 de mayo de 2026
Proyecto:	Implementación CRM — CASUR
Área:	Subdirección de Bienestar y Atención Integral al Afiliado
Dirigido a:	Equipo de Apoyo Técnico
Referencia:	Solicitud de Sesiones

1. Objetivo

Solicitar formalmente al Equipo de Apoyo Técnico la aprobación de los rangos semanales en los cuales se ejecutarán las sesiones de trabajo correspondientes al Cronograma Operativo de mayo de 2026.

2. Antecedentes

El Cronograma Operativo de mayo de 2026 fue aprobado previamente. Para habilitar la convocatoria de los funcionarios involucrados y reservar los espacios necesarios, se requiere la aprobación formal de los rangos semanales en los que se llevarán a cabo las sesiones de cada fase.

3. Rangos solicitados

Bloque	Rango semanal	Fase del cronograma	Encargado
Bloque 1	Semana 25 – 29 de mayo	Levantamiento y diagnóstico operativo	Alejandra Vaca Gestión documental

4. Solicitud de aprobación

De manera atenta se solicita al Equipo de Apoyo Técnico la aprobación de los rangos semanales aquí relacionados y la coordinación de las mesas de trabajo, con el fin de habilitar la convocatoria oficial de los funcionarios y la reserva de los espacios y recursos requeridos para la ejecución de las sesiones del proyecto.

Solicitante — **Aprobado por — Apoyo Técnico**

Nombre: Ing. Rafael García
Cargo: Director de Proyectos


Nombre:
Cargo:

+57 3182011697 www.cloudcity.com.co info@cloudcity.com.co Cra 11 # 71-41 Of 602 Bogotá, Colombia

CloudCity
Software Factory

Ing. Jackson Ramirez
CEO Founder
Gerencia | Cloud City Colombia SAS
Agencia de Desarrollo de Software y Marketing Digital

Evidencia 2: Envío de Solicitud de Aprobación del Kit de Instrumentos (En este espacio se evidencia la remisión formal de los Anexos 2, 3 y 6 al equipo de supervisión técnica de CASUR para aprobar la metodología del proyecto).

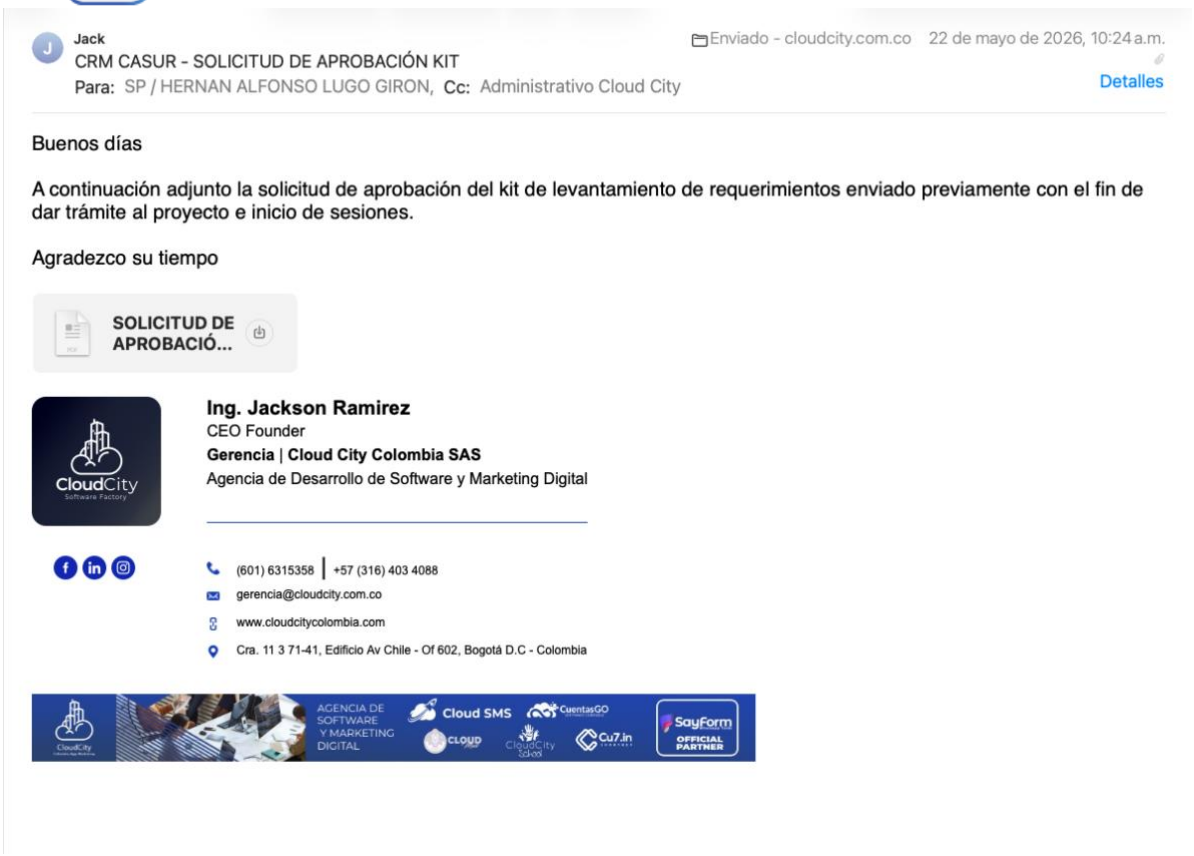

Jack
CRM CASUR - SOLICITUD DE APROBACIÓN KIT
Para: SP / HERNAN ALFONSO LUGO GIRON, Cc: Administrativo Cloud City
Enviado - cloudcity.com.co 22 de mayo de 2026, 10:24 a.m.
Detalles

Buenos días

A continuación adjunto la solicitud de aprobación del kit de levantamiento de requerimientos enviado previamente con el fin de dar trámite al proyecto e inicio de sesiones.

Agradezco su tiempo

SOLICITUD DE APROBACIÓ...

Ing. Jackson Ramirez
CEO Founder
Gerencia | Cloud City Colombia SAS
Agencia de Desarrollo de Software y Marketing Digital

(601) 6315358 | +57 (316) 403 4088
gerencia@cloudcity.com.co
www.cloudcitycolombia.com
Cra. 11 3 71-41, Edificio Av Chile - Of 602, Bogotá D.C - Colombia

AGENCIA DE SOFTWARE Y MARKETING DIGITAL
Cloud SMS
CuentasGO
Cu7.in
SayForm OFFICIAL PARTNER

Evidencia 3: Envío del Informe de Diseño e Implementación (En este espacio se evidencia la remisión del Anexo 1 que documenta el avance tecnológico en el desarrollo de la plataforma).

CloudCity
SOFTWARE AI FACTORY

Jack
CRM CASUR - KIT LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Para: SP / HERNAN ALFONSO LUGO GIRON, Cc: Administrativo Cloud City

Enviado - cloudcity.com.co 22 de mayo de 2026, 10:11a.m.
Detalles

Buenos días, estimado ingeniero a continuación adjunto documento con el kit de instrumentos de levantamiento de información de el trabajo de campo efectuar para el proyecto CRM CASUR, lo anterior acompañado con la respectivas planillas que serán de uso exclusivo del personal de Cloud City Colombia, para las reuniones y sesiones las cuales serán previamente programadas con el área encargada

Kit-Instrumento...

INSTRUMENTOS ...

Muchas gracias

Ing. Jackson Ramirez
CEO Founder
Gerencia | Cloud City Colombia SAS
Agencia de Desarrollo de Software y Marketing Digital

(601) 6315358 | +57 (316) 403 4088
gerencia@cloudcity.com.co
www.cloudcitycolombia.com
Cra. 42 #22A-23, Edificio BTU - Of 402, Bogotá D.C - Colombia



Atentamente:



JONATHAN DAVID LUNA
Cédula de Ciudadanía No. 1.073.706.360
En Calidad de REPRESENTANTE LEGAL
Empresa: CLOUD CITY COLOMBIA SAS
Nit: 901.249.716-3
Email: administrativo@cloudcity.com.co
Website: www.cloudcitycolombia.com
Ciudad: Bogotá
