INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA – JULIO

Fecha:	28 DE AGOSTO DE 2026
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y LICENCIAMIENTO SAAS
Objeto del Contrato:	CONSULTORÍA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, DESFRAGMENTACIÓN DE PROCESOS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ECOSISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OPTIMIZACIÓN OPERATIVA HACIA EL MODELO DE "CERO PAPEL" Y GESTIÓN ATÓMICA INSTITUCIONAL.
Contratista	
Nombre:	CLOUD CITY COLOMBIA SAS
Nit:	901249716-3
Tel:	(601) 656-4021 - 3182011697
Email:	administrativo@cloudcity.com.co
Contratante:	DIBANKA

Presentación de Informe de Contratista	
Contratista: CLOUD CITY COLOMBIA SAS	
Periodo reportado:	JULIO - AGOSTO

PRESENTACIÓN:

Durante el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 24 de julio de 2026, CLOUD CITY COLOMBIA S.A.S., en coordinación con el equipo de apoyo técnico de CASUR, desarrolló las jornadas de levantamiento y caracterización funcional de los procesos de las dependencias de la entidad, como parte de la consultoría para la implementación y parametrización del sistema CRM institucional. En continuidad con el informe anterior, en este periodo se realizaron 20 sesiones de trabajo (actas No. 005 a 024) con 17 dependencias: Gestión Inmobiliaria, Presupuesto, Contratos, Gestión Logística, Almacén y Suministros, Bienestar y Atención al Afiliado, Notificaciones, Nómina, Tesorería, Control Interno Disciplinario, Prevención al Fraude, Comunicaciones Estratégicas, Gobierno Digital y Seguridad de la Información, Atención al Afiliado Veterano y la Oficina Asesora de Planeación.

Las sesiones permitieron documentar la situación actual de los procesos (AS-IS) de cada dependencia: sus responsables, flujos de trabajo, documentos y formatos utilizados, sistemas de información involucrados (entre ellos Gestor documental, SIIF, JD Edwards, SIMPRES, Suite Visión y SECOP), interacciones entre áreas y oportunidades de mejora. Del levantamiento se destacan hallazgos transversales como el uso extendido de hojas

de cálculo y correo electrónico como herramientas de control y trámite, las limitaciones de usabilidad de las plataformas documentales actuales y la necesidad de fortalecer la trazabilidad, la centralización de la información y la automatización de los procesos.

Como resultado de las sesiones se identificaron, además, decisiones relevantes para el alcance del proyecto, entre ellas la exclusión del Grupo de Control Interno Disciplinario del CRM, dada la confidencialidad de la información que gestiona, y quedaron establecidos compromisos de entrega de formatos, plantillas e insumos por parte de las dependencias y de CLOUD CITY COLOMBIA S.A.S., necesarios para las siguientes fases.

El presente informe consolida los principales temas tratados en las reuniones, las dependencias caracterizadas, los aspectos funcionales identificados y los compromisos establecidos, como base para continuar con el levantamiento de información y el diseño de la solución tecnológica.

TEMAS TRATADOS DURANTE EL PERIODO:

Durante las sesiones de trabajo realizadas con las diferentes dependencias de CASUR se abordaron, entre otros, los siguientes temas:

1. Levantamiento y caracterización de procesos, identificando actividades, responsables, documentos, sistemas utilizados y flujos de trabajo de cada dependencia.
2. Gestión documental, incluyendo radicación, expedientes, memorandos, oficios, resoluciones, actos administrativos, anexos y manejo documental mediante Gestor Documental.
3. Interacción entre dependencias, documentando los procesos que involucran a áreas como Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Contratación, Planeación, Gestión Documental, Notificaciones y las dependencias misionales.
4. Sistemas de información institucionales, identificando el uso de plataformas como Gestor Documental, Suite Visión, JD Edwards, JD Towers, SIIF, SIMPRES, DiBanka, GLPI, SECOP y el operador postal 4-72, así como el uso extendido de archivos Excel y correo electrónico como herramientas de control y trámite.
5. Procesos financieros, comprendiendo la gestión presupuestal, órdenes de pago, tesorería, cartera, préstamos, libranzas, cuentas bancarias y administración de contratos, así como el proceso de nómina de afiliados y beneficiarios, con sus procedimientos de liquidación, novedades de descuentos, revisión de prenómina y verificación periódica de fallecidos ante la Registraduría.
6. Procesos de contratación, incluyendo la elaboración de estudios previos, modalidades de contratación (Ley 1150 de 2007), Plan Anual de Adquisiciones (PAA), SECOP, expedientes contractuales y seguimiento contractual.
7. Procesos de atención al afiliado y bienestar, documentando programas institucionales, atención de requerimientos, convenios, capacitaciones,

emprendimiento, empleabilidad, educación, atención a veteranos y mecanismos de seguimiento.

8. Gestión inmobiliaria, identificando el proceso comercial, administración de inmuebles, contratos de arrendamiento, cartera, préstamos y control de información mediante JD Edwards y archivos de seguimiento.
9. Logística, almacén y suministros, documentando el manejo de inventarios, entradas y salidas de bienes, bajas de activos, mantenimiento, servicios públicos y administración documental.
10. Gestión de notificaciones, comprendiendo la elaboración, envío, seguimiento y control de resoluciones, comunicaciones oficiales, notificación mediante el operador postal 4-72, términos legales de respuesta y trazabilidad de las actuaciones administrativas.
11. Prevención al fraude, identificando el flujo de investigaciones, análisis de casos, expedientes, conceptos técnicos, informes confidenciales y los requerimientos de trazabilidad y control de acceso para el CRM, incluyendo el registro de consulta, edición, descarga y eliminación de documentos con fecha y hora.
12. Gobierno digital y seguridad de la información, documentando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la gestión de usuarios y accesos mediante GLPI, las alertas de seguridad, el plan de sensibilización institucional y la política de Cero Papel.
13. Planeación institucional, documentando la administración de indicadores, planes institucionales, planes de mejoramiento, actos administrativos, seguimiento al PAA e informes de gestión.
14. Comunicaciones estratégicas, incluyendo la administración del portal web, redes sociales, campañas institucionales, transmisiones en vivo, métricas de comunicación y seguimiento de indicadores.
15. Infraestructura y Sistemas de Información, con la cual se realizó una sesión preliminar de acercamiento y contextualización para presentar el alcance del levantamiento funcional y acordar la programación de las jornadas formales de trabajo, cuya documentación se realizará en el siguiente periodo.
16. Delimitación del alcance del CRM institucional, incluyendo la decisión de excluir al Grupo de Control Interno Disciplinario, dada la naturaleza confidencial de la información y de los procesos disciplinarios que gestiona.
17. Identificación de oportunidades de mejora, orientadas a disminuir el uso de archivos Excel, integrar la información entre dependencias, automatizar procesos, fortalecer la seguridad de la información, mejorar la trazabilidad y optimizar los mecanismos de seguimiento mediante el CRM institucional.
18. Seguimiento al proyecto, mediante interacciones permanentes de coordinación con el equipo técnico de CASUR para revisar el avance del levantamiento, identificar dependencias pendientes y programar las siguientes jornadas de trabajo.

DESARROLLO DE LAS SESIONES:

Las mesas de trabajo del periodo quedaron documentadas en las actas de reunión que se relacionan como anexos. A continuación, se amplía el desarrollo de cada sesión, los temas discutidos, los compromisos adquiridos y la participación de los firmantes.

Sesión 1 - Grupo de Nóminas y Embargos

Campo	Detalle
Fecha	28 de julio de 2026
Horario	10:40 a. m. – 02:30 p. m.
Lugar	CASUR – Grupo de Nóminas y Embargos
Objeto	Realizar el levantamiento de información con el **Grupo de Nóminas y Embargos**, específicamente del proceso de **Embargos**, con el fin de documentar su funcionamiento actual e identificar oportunidades de mejora y automatización.

N°	Nombre	Cargo	Empresa/Dependencia
1	Jose Daniel Vega	A.A.	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	Evidencia:
Sesión 1 – Levantamiento inicial del proceso de Embargos Se realizó el levantamiento general del proceso de **Embargos**, identificando cómo se reciben las solicitudes principalmente por correo electrónico y las validaciones que se realizan en **SIMPRES**. Se revisó el manejo de documentos adjuntos, la consulta de información del funcionario, la existencia de embargos previos y los diferentes tipos de solicitudes.	

También se identificaron actividades relacionadas con **paz y salvo, certificaciones, cuentas, procesos de insolvencia y participación del área jurídica**, evidenciando la necesidad de mejorar la trazabilidad de las solicitudes y comunicaciones.	
Fecha y hora:	28 de julio de 2026, 10:40 a. m.
Sesión 2 – Validación y detalle del flujo de Embargos Se profundizó en el flujo operativo, desde la **recepción de la orden de embargo hasta su aplicación en nómina**. Se revisaron los diferentes tipos de embargo, las reglas y prioridades aplicables, la consulta de embargos existentes y los procesos de **aplicación, modificación o retiro**. Finalmente, se documentó la elaboración del **oficio de respuesta**, su revisión, visto bueno y firma, el envío al juzgado o interesado y la remisión de la documentación al área documental. Se identificaron oportunidades para automatizar estas actividades y centralizar el seguimiento del proceso.	
Fecha y hora:	28 de junio de 2026, 2:30 p. m.

Se anexa Acta 025

Sesión 2 - Grupo de Nóminas y Embargos (Descuentos Directos)

Campo	Detalle
Fecha	28 de julio de 2026

Horario	2:41 a. m. – 03:21 p. m.
Lugar	CASUR – Grupo de Nóminas y Embargos (Descuentos)
Objeto	Realizar el levantamiento de información del proceso de **Descuentos Directos**, con el fin de documentar su funcionamiento actual, identificar las actividades y validaciones realizadas, y establecer oportunidades de mejora y automatización.

N°	Nombre	Cargo	Empresa/Dependencia
1	William Guillermo Florez	A.S.	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
Se realizó el **levantamiento de información del proceso de Descuentos Directos del Grupo de Nóminas y Embargos**, con el propósito de conocer y documentar su funcionamiento actual. Durante la sesión se revisaron la recepción y validación de solicitudes, consultas en **SIMPRES**, gestión de paz y salvos, certificaciones, novedades y procesos de insolvencia, así como el manejo de respuestas por correo electrónico y su trazabilidad. Adicionalmente, se identificaron actividades manuales y oportunidades de mejora relacionadas con la **centralización de la información, seguimiento de solicitudes y automatización del proceso**. Como compromiso, se estableció la solicitud del formato correspondiente al proceso de insolvencia.	

Fecha y hora:	28 de julio de 2026, 2:41 p.m

Se anexa Acta 026

Sesión 3 - Grupo de Bienestar y Atenciòn al Afiliado

Campo	**Detalle**
Fecha	29 de julio de 2026
Horario	9:34 a. m. – 11:30 p. m.
Lugar	CASUR – Grupo de Bienestar y Atenciòn al Afiliado
Objeto	Realizar la **segunda sesión de levantamiento de información con el Grupo de Bienestar y Atención al Afiliado**, con el fin de profundizar en los procesos actuales, identificar las actividades, formatos, reportes e indicadores utilizados, y establecer oportunidades de mejora y automatización.

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Empresa/Dependencia**
1	Cecilia Bonilla	Contratista	CASUR
2	Jaime Gomez	T.A	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
Se realizó la **sesión de levantamiento de información con el Grupo de Bienestar y Atención al Afiliado**, profundizando en la gestión de programas como **Vida Saludable, Vulnerabilidad y actividades de bienestar**, así como en el manejo de encuestas de satisfacción, presupuestos, estadísticas, indicadores y reportes.	

Durante la sesión también se revisaron los **formatos y archivos utilizados actualmente**, identificando oportunidades para **centralizar la información, optimizar la generación de reportes y automatizar actividades de seguimiento y control**.	
Fecha y hora:	29 Julio del 2026, 9:34 a.m

Se anexa Acta 027

Sesión 4 - Reuniòn con los Ingenieros de Sistemas

Campo	**Detalle**
Fecha	29 de julio de 2026
Horario	12:00 a. m. – 1:00 p. m.
Lugar	CASUR – Grupo de sistemas
Objeto	Reunión con el equipo de ingeniería para **revisar el proceso de Embargos y validar los protocolos de seguridad aplicables a la interacción con terceros**.

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Empresa/Dependencia**
1	Hernan Lugo	Ing. Sistemas	CASUR
2	Edison Rodriguez	Ing. Sistemas	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**

Se realizó una reunión con el **equipo de ingeniería** para revisar el proceso de **Embargos**, analizar su funcionamiento actual y validar los **protocolos y controles de seguridad requeridos para la interacción e intercambio de información con terceros**, con el fin de garantizar un manejo adecuado y seguro de la información.	
Fecha y hora:	29 de julio de 2026, 12:00 a.m

Sesión 5 - Grupo de Bienestar y Atenciòn al Afiliado

Campo	**Detalle**
Fecha	3 de agosto de 2026
Horario	10:10 a. m. – 12:00 a. m.
Lugar	CASUR – Grupo de Bienestar y Atenciòn al Afiliado
Objeto	

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Empresa/Dependencia**
1	Nataly Mateus	P.D	
2	Cecilia Bonilla	Contratista	
3	Jaime Gomez	T.A	
4	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
5	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**

	
Fecha y hora:	3 de agosto de 2026 , 10:10 a.m

Se anexa Acta 028

Sesión 6 - Grupo de Nóminas y Embargos (SIMPRES)

Campo	**Detalle**
Fecha	5 de agosto del 2026
Horario	8:00 a.m - 8:32 a.m
Lugar	TEAMS – Grupo de Nóminas y Embargos (Veteranos)
Objeto	ealizar el **levantamiento de información técnica sobre SIMPRES**, con el fin de identificar la estructura y disponibilidad de la información relacionada con **Embargos**, así como validar los mecanismos de consulta, integración y acceso requeridos para el proceso.

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Empresa/Dependencia**
1	Marcela Jaramillo	Ing. de Sistemas	CASUR
2	Almiro Sarmiento	Ing. de Sistemas	CASUR
	Edison Rodriguez	Ing. de Sistemas	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
Se realizó una reunión técnica para revisar la información disponible en **SIMPRES relacionada con Embargos**, incluyendo las tablas, vistas y datos requeridos para su	

consulta. Asimismo, se analizaron las alternativas de **integración y acceso a la información**, los usuarios y permisos necesarios, y los requerimientos para habilitar las consultas desde la solución a implementar.	
Fecha y hora:	5 de agosto del 2026 - 8:00 a.m

Se anexa Acta 029

Sesión 7 - Grupo de Bienestar y Atenciòn al Afiliado (Veteranos)

Campo	**Detalle**
Fecha	11 de agosto del 2026
Horario	11:45 a.m - 12:30 a.m
Lugar	TEAMS – Grupo de Bienestar y Atenciòn al Afiliado (Veteranos)
Objeto	Realizar una reunión con el **Grupo de Bienestar y Atención al Afiliado** para revisar y validar los **formularios de asistencia, inscripción y registro utilizados en las actividades virtuales**, identificando su funcionamiento y oportunidades de mejora.

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Empresa/Dependencia**
1	Grupo de Bienestar	Bienestar	CASUR
2	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
3	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
Se revisó el proceso de **inscripción y control de asistencia a las actividades virtuales**, incluyendo los formularios utilizados, datos básicos de los afiliados, encuestas, generación de códigos QR, registro de participantes y manejo de certificados. También se analizaron aspectos relacionados con la integración con	

Teams, la realización de actividades presenciales y virtuales y la necesidad de optimizar el registro y seguimiento de los asistentes.	
Fecha y hora:	11 de agosto del 2026 - 11:45 a.m

Se anexa Acta 030

Sesión 8 - Grupo de Bienestar y Atenciòn al Afiliado

Campo	**Detalle**
Fecha	13 de agosto del 2026
Horario	9:00 a.m - 10:00 am
Lugar	TEAMS – Grupo de Bienestar y Atenciòn al Afiliado
Objeto	Realizar una reunión con el **Grupo de Bienestar y Atención al Afiliado** para presentar los avances realizados en el **CRM**, validar las funcionalidades implementadas y recopilar observaciones y nuevos requerimientos que permitan continuar fortaleciendo la solución de acuerdo con las necesidades del área.

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Empresa/Dependencia**
1	Paola Sanchez	Bienestar	CASUR
2	Gissel Riascos	Bienestar	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
Se realizó la presentación de los **avances del CRM para el área de Bienestar**, mostrando las funcionalidades desarrolladas hasta el momento. Durante la sesión, el equipo de Bienestar realizó observaciones y recomendaciones sobre lo implementado, identificando **ajustes y mejoras**, así como nuevas funcionalidades y requerimientos que	

desean incorporar en las siguientes etapas del desarrollo.	
Fecha y hora:	13 agosto del 2026 - 9:00 a.m

Sesión 9 - Grupo de Nóminas y Embargos (SIMPRES)

Campo	**Detalle**
Fecha	20 de agosto del 2026
Horario	9:00 a.m - 11:00 a.m
Lugar	TEAMS – Grupo de Nóminas y Embargos (SIMPRES)
Objeto	Realizar una reunión técnica con el **equipo de ingeniería** para gestionar la entrega de las **credenciales de acceso a SIMPRES**, necesarias para continuar con las actividades de consulta e integración de información.

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Empresa/Dependencia**
1	Almiro Sarmiento	Ing. Sistemas	CASUR
2	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
3	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
Se realizó una reunión con el **equipo de ingeniería**, durante la cual se proporcionaron las **credenciales de acceso a SIMPRES** y se validó su funcionamiento. Asimismo, se revisaron los aspectos técnicos necesarios para realizar las consultas requeridas y continuar con el proceso de integración con la solución en desarrollo.	
Fecha y hora:	20 de agosto del 2026 - 9:00 a.m

Sesión 10 - Sesiòn con Ing. Hernán Lugo - Ing. Edison Rodriguez

Campo	**Detalle**
Fecha	24 de agosto del 2026
Horario	2:00 p.m - 3:30 p.m

Lugar	TEAMS – Sesiòn con Ing. Hernan Lugo - Ing. Edison Rodriguez
Objeto	Realizar una reunión con los ingenieros **Hernán Lugo y Edison Rodríguez** para presentar los avances realizados en el **CRM y sus diferentes módulos**, con el fin de validar el desarrollo y recopilar observaciones y recomendaciones.

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Empresa/Dependencia**
1	Hernan Lugo	Ing. Sistemas	CASUR
2	Edison Rodriguez	Ing. Sistemas	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
Se realizó la presentación de los **avances del CRM y los módulos desarrollados hasta el momento** a los ingenieros Hernán Lugo y Edison Rodríguez. Durante la sesión se revisaron las funcionalidades implementadas y se recibieron **observaciones, recomendaciones y posibles ajustes**, con el propósito de continuar fortaleciendo la solución de acuerdo con las necesidades identificadas.	
Fecha y hora:	21 agosto 2026 - 2:00 pm

Sesión 11 - Sesiòn con Ing. Hernán Lugo - Ing. Edison Rodriguez

Campo	**Detalle**
Fecha	24 de agosto del 2026
Horario	10:00 a.m - 11:00 a.m
Lugar	CASUR – Reuniòn con Ing. Hernán Lugo - Ing. Edison Rodriguez
Objeto	Realizar una reunión con el **equipo de ingeniería** para identificar las **dependencias pendientes por involucrar en el proyecto**, coordinar la programación de sesiones con dichas áreas y recibir recomendaciones para la implementación del **CRM**.

N°	Nombre	Cargo	Empresa/Dependencia
1	Hernan Lugo	Ing. Sistemas	CASUR
2	Edison Rodriguez	Ing. Sistemas	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
El **24 de agosto** se realizó una reunión con el equipo de ingeniería para revisar el avance del proyecto e identificar las **dependencias con las que aún se requiere realizar sesiones de trabajo**. Asimismo, se solicitó gestionar la agenda con estas áreas y se recibieron **recomendaciones técnicas y funcionales para fortalecer la implementación del CRM**.	
Fecha y hora:	24 agosto 2026 - 10:00 a.m

Sesión 12 - Grupo de Contabilidad


Campo	**Detalle**
Fecha	21 de agosto del 2026
Horario	11:00 a.m - 12:00 a.m
Lugar	CASUR – Grupo de Contabilidad
Objeto	Realizar el **levantamiento de información de los procesos del Grupo de Contabilidad**, con el fin de conocer su funcionamiento actual, identificar los documentos, sistemas, responsables y controles utilizados, y establecer oportunidades de mejora, trazabilidad y automatización mediante el CRM.

N°	Nombre	Cargo	Empresa/Dependencia
1	Grupo Contabilidad	Contabilidad	CASUR
3	Karol Andrea Hernández	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia
4	Rafael José García	Ing. de Sistemas	Cloud City Colombia

Descripción	**Evidencia:**
Se realizó el levantamiento de información con el **Grupo de Contabilidad**, revisando los procesos de **cierre contable, conciliaciones bancarias y trámite y pago de cuentas**. Se identificaron los sistemas, documentos y actividades utilizados actualmente, así como oportunidades para mejorar la **trazabilidad, gestión documental y automatización de los procesos**.	
Fecha y hora:	24 agosto 2026 - 11:00 a.m

Como continuación de las sesiones presenciales y virtuales realizadas con el equipo, a continuación se presentan los módulos disponibles en la plataforma CASUR CRM, junto con las capturas de pantalla de sus respectivas interfaces y los principales hitos alcanzados durante su desarrollo.

1. Dashboard CASUR

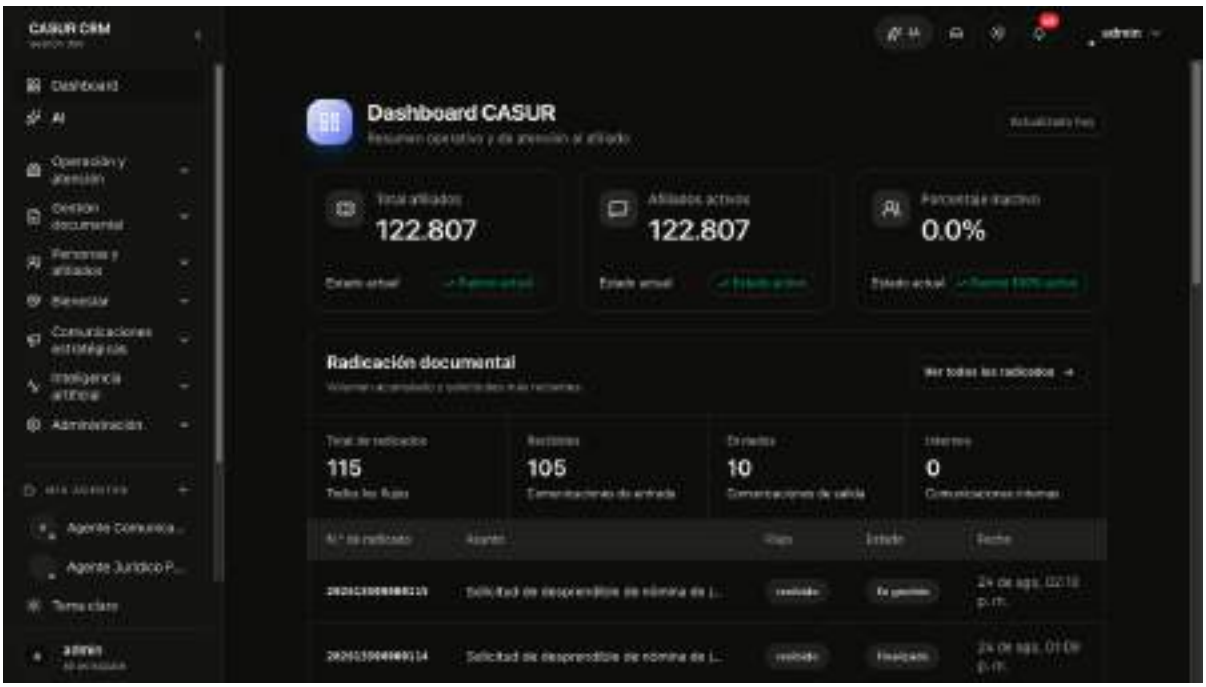

Panel principal de la plataforma con el resumen operativo y de atención al afiliado.

Hitos alcanzados:

- Indicadores consolidados: total de afiliados (122.807), afiliados activos (122.807) y porcentaje de inactivos (0.0%), reflejando un padrón 100% activo.
- Módulo de radicación documental con métricas en tiempo real: 115 radicados totales, 105 recibidos, 10 enviados y 0 internos.
- Listado de los radicados más recientes con número, asunto, flujo, estado y fecha, permitiendo seguimiento inmediato de la gestión documental.

2. AI — Asistente Inteligente CASUR



Orquestador conversacional que centraliza la interacción con los agentes de IA del sistema.

Hitos alcanzados:

- Interfaz de nueva conversación con accesos rápidos preconfigurados: radicados pendientes, redacción de respuestas oficiales, resumen de tareas y consulta de afiliados.
- Campo de mensaje libre para instrucciones en lenguaje natural dirigidas al asistente corporativo.

3. Operación y atención — Oficina virtual




Vista de 'Órbita de agentes' que muestra en tiempo real el estado de los agentes de IA operativos (Agente Radicación, Agente Jurídico PQRSD).

Hitos alcanzados:

- Visualización dinámica y en tiempo real del estado ('En línea') de cada agente virtual desplegado en la operación.

4. Operación y atención — Inbox de email

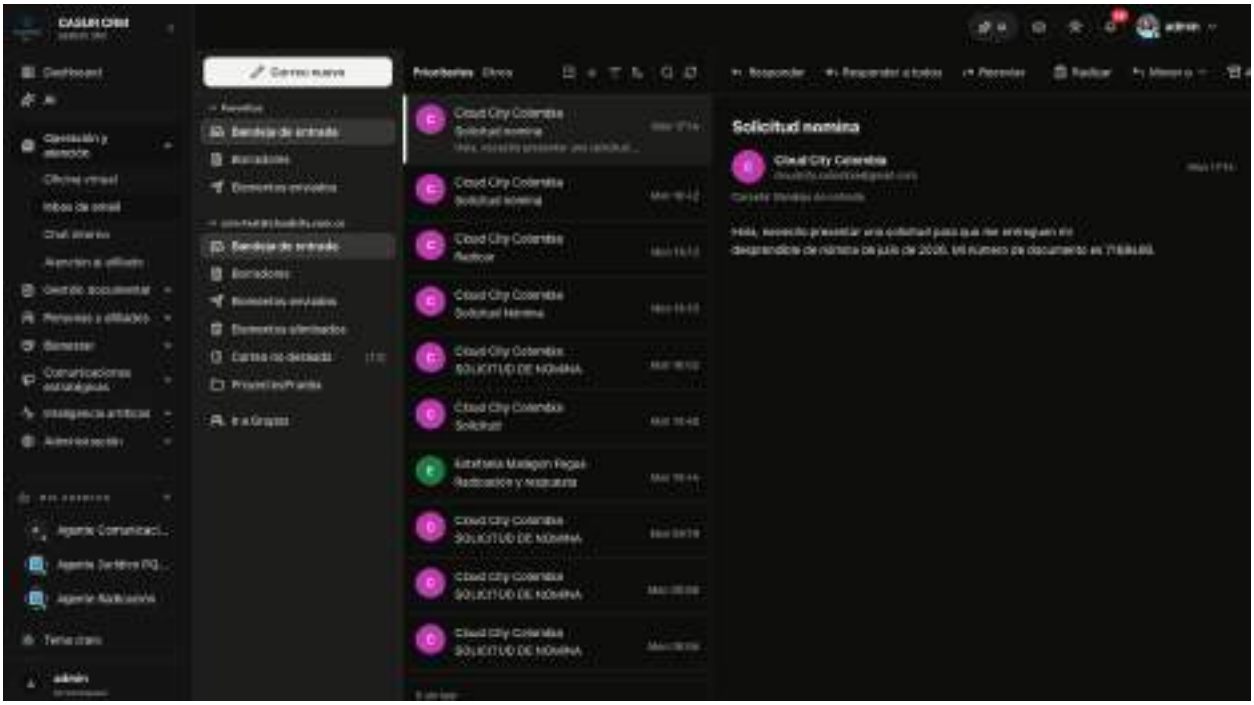


Bandeja de correo institucional integrada al CRM, organizada por carpetas (Bandeja de entrada, Borradores, Enviados, Eliminados, Correo no deseado).

Hitos alcanzados:

- Sincronización de múltiples cuentas de correo institucional dentro del CRM, unificando la atención al afiliado por canal email.
- Clasificación de mensajes prioritarios y gestión de correo no deseado directamente desde la plataforma.

5. Operación y atención — Chat interno

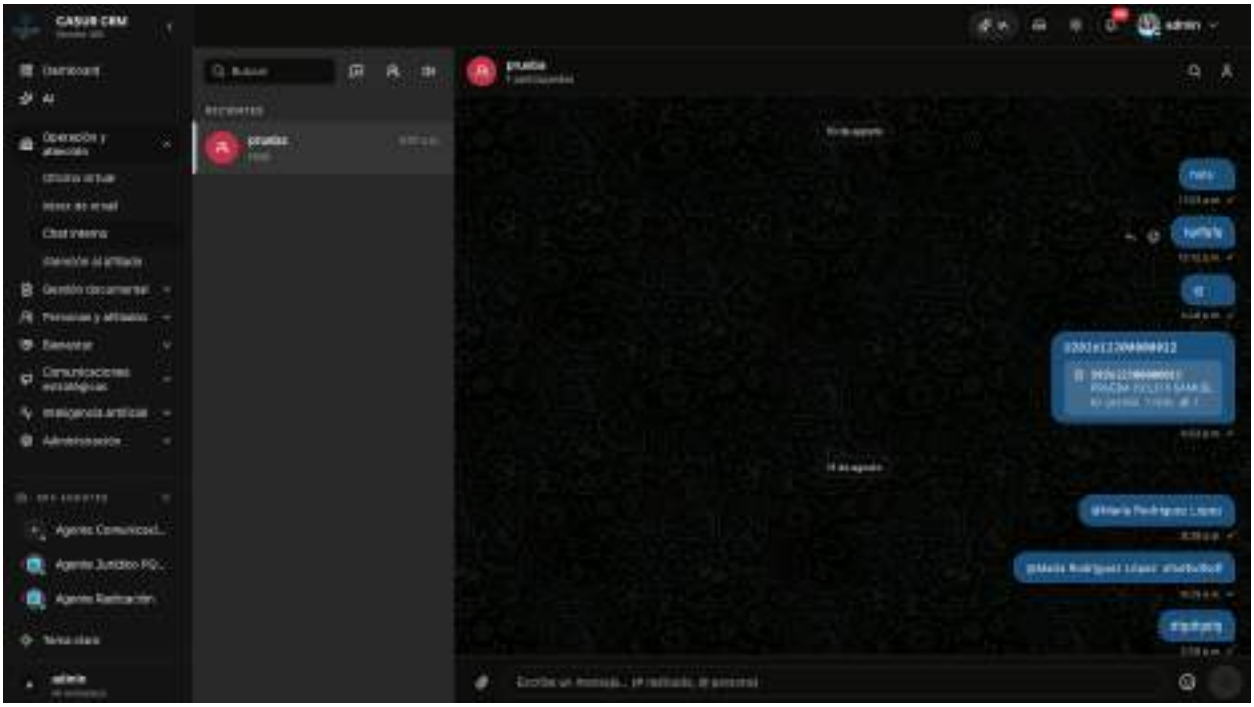


Mensajería interna entre funcionarios con capacidad de mencionar radicados y personas.

Hitos alcanzados:

- Vinculación de radicados directamente en la conversación (ejemplo: referencia a un radicado con su estado 'En gestión').
- Historial de conversaciones organizado por fecha.

6. Operación y atención — Atención al afiliado

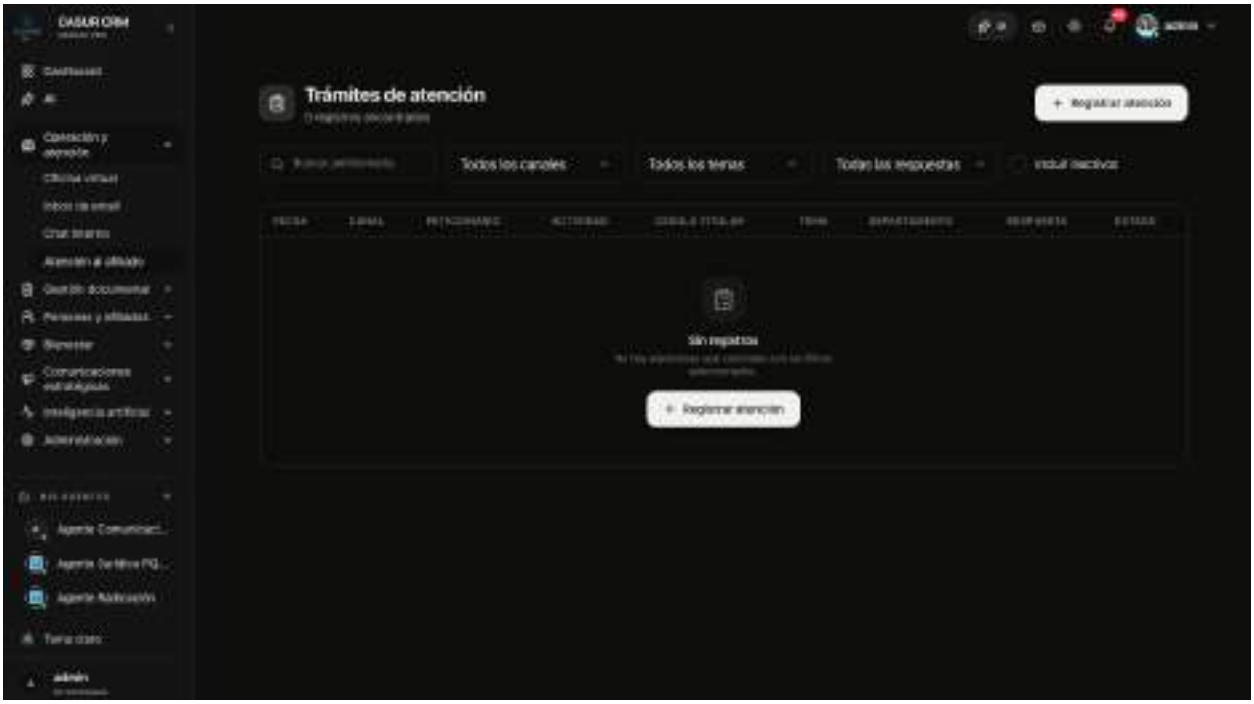




Módulo de trámites de atención donde se registran las solicitudes de los afiliados por distintos canales.

Hitos alcanzados:

- Filtros por canal, tema y tipo de respuesta para el seguimiento de trámites.
- Registro estructurado de nuevas atenciones con trazabilidad de petición, actividad, cédula del titular y departamento responsable.

7. Gestión documental — Bandeja de entrada / Consulta de radicados

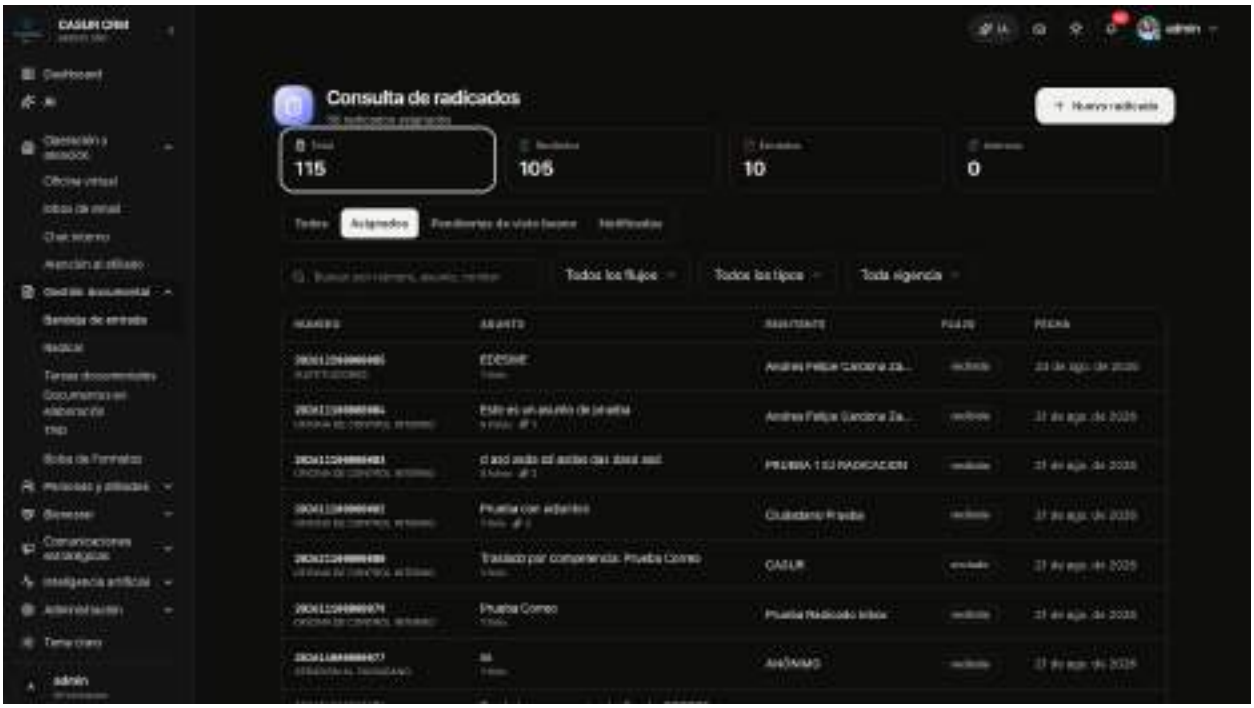


Consulta centralizada de la correspondencia radicada en la entidad.

Hitos alcanzados:

- Trazabilidad completa: 115 radicados totales, 105 recibidos, 10 enviados, 0 internos, con 58 radicados asignados al usuario.
- Filtros por flujo, tipo y vigencia, además de vistas por pestañas (Todos, Asignados, Pendientes de visto bueno, Notificados).

8. Gestión documental — Radicar (PQRSCF)

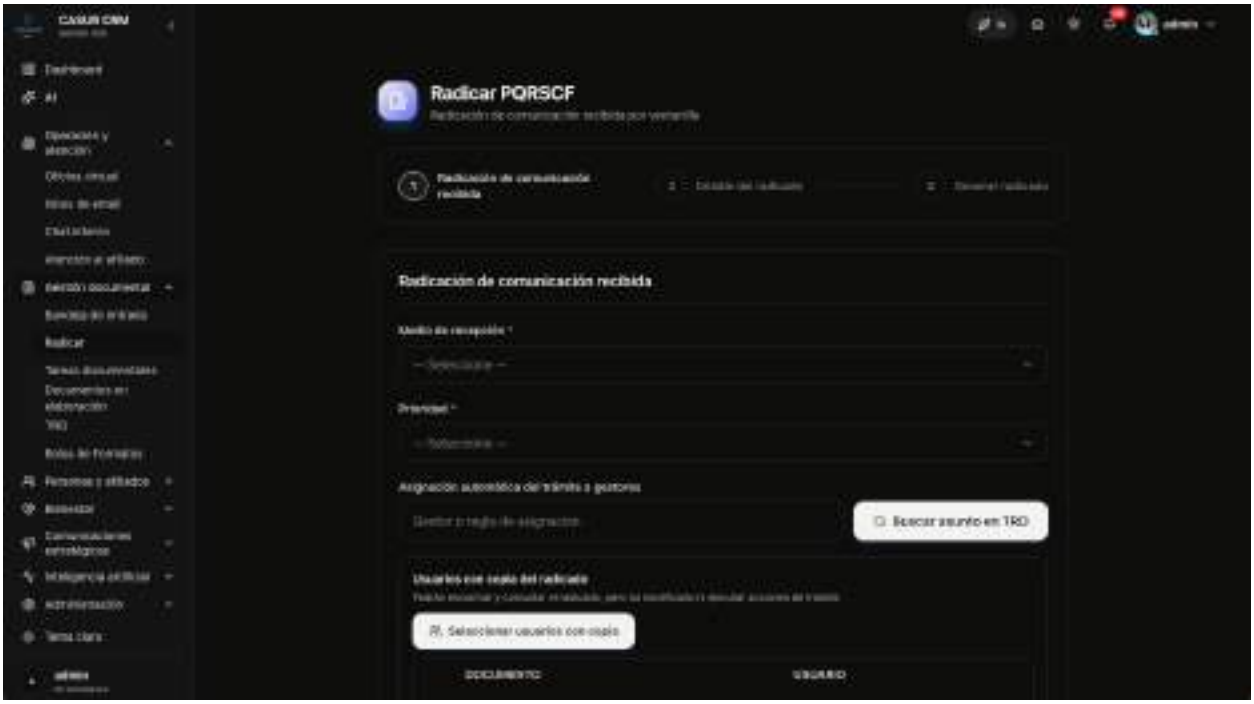


Flujo guiado en tres pasos para la radicación de comunicaciones recibidas por ventanilla.

Hitos alcanzados:

- Asignación automática del trámite a gestores mediante reglas configurables y búsqueda de asunto en TRD.
- Definición de prioridad, medio de recepción y usuarios con copia del radicado, estandarizando el proceso de radicación.

9. Gestión documental — Tareas documentales

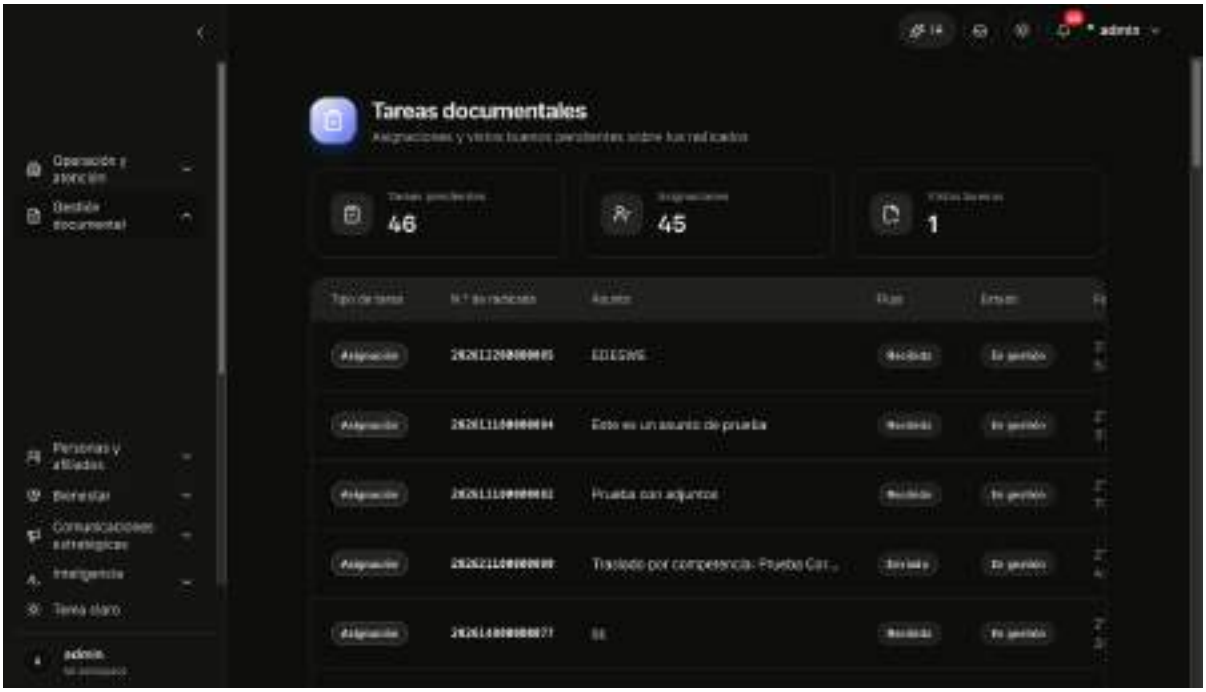

Panel de asignaciones y vistos buenos pendientes sobre los radicados del usuario.

Hitos alcanzados:

- Consolidado de 46 tareas pendientes, 45 asignaciones y 1 visto bueno pendiente, con acceso directo a cada radicado.

10. Gestión documental — Documentos en elaboración




Editor de documentos generados a partir de la Bolsa de Formatos, con estados de guardado y borrador.

Hitos alcanzados:

- Trazabilidad del ciclo de vida del documento (Borrador → Guardado) con fecha y hora de última edición.

11. Gestión documental — Tablas de Retención Documental (TRD)

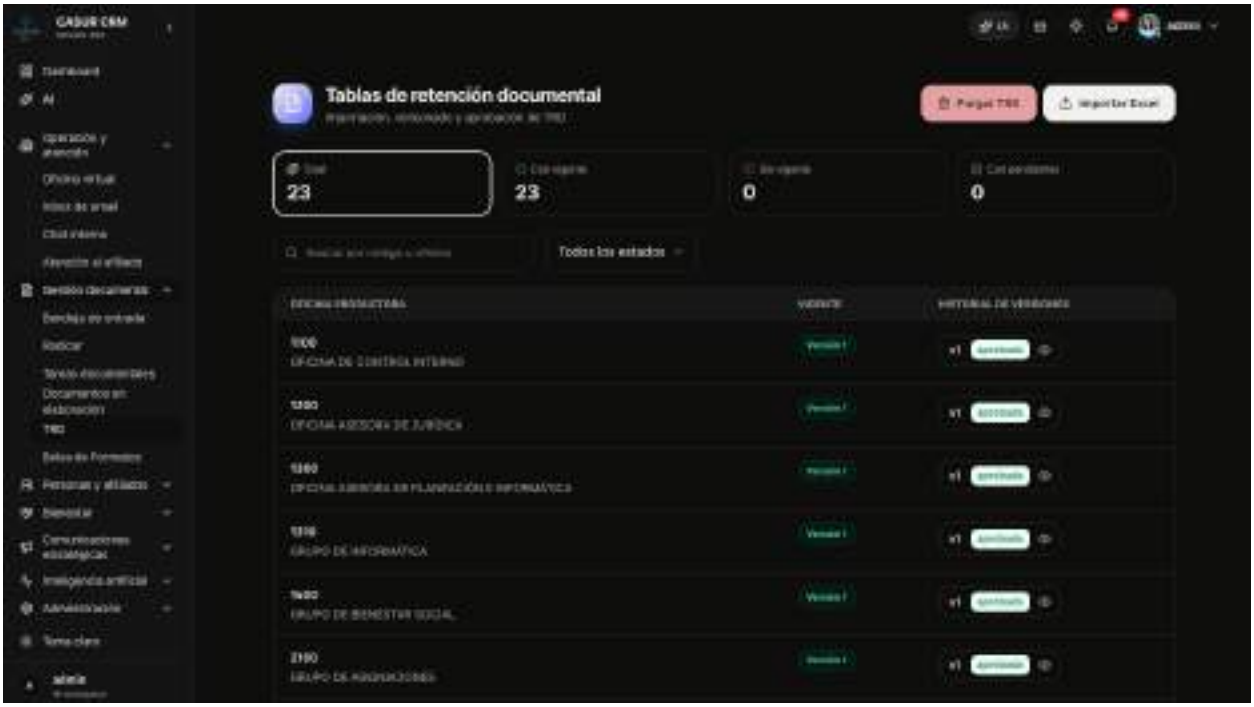

Administración de las TRD por oficina productora, con versionado y aprobación.

Hitos alcanzados:

- 23 TRD registradas, el 100% con versión vigente y aprobada (0 pendientes, 0 sin vigencia).
- Historial de versiones por oficina productora, soportando la importación desde Excel.

12. Gestión documental — Bolsa de Formatos




Repositorio de plantillas DOCX reutilizables para elaborar y combinar comunicaciones oficiales.

Hitos alcanzados:

- Gestión de plantillas activas con control de dependencias, estado y fecha de actualización.

13. Personas y afiliados — Afiliados

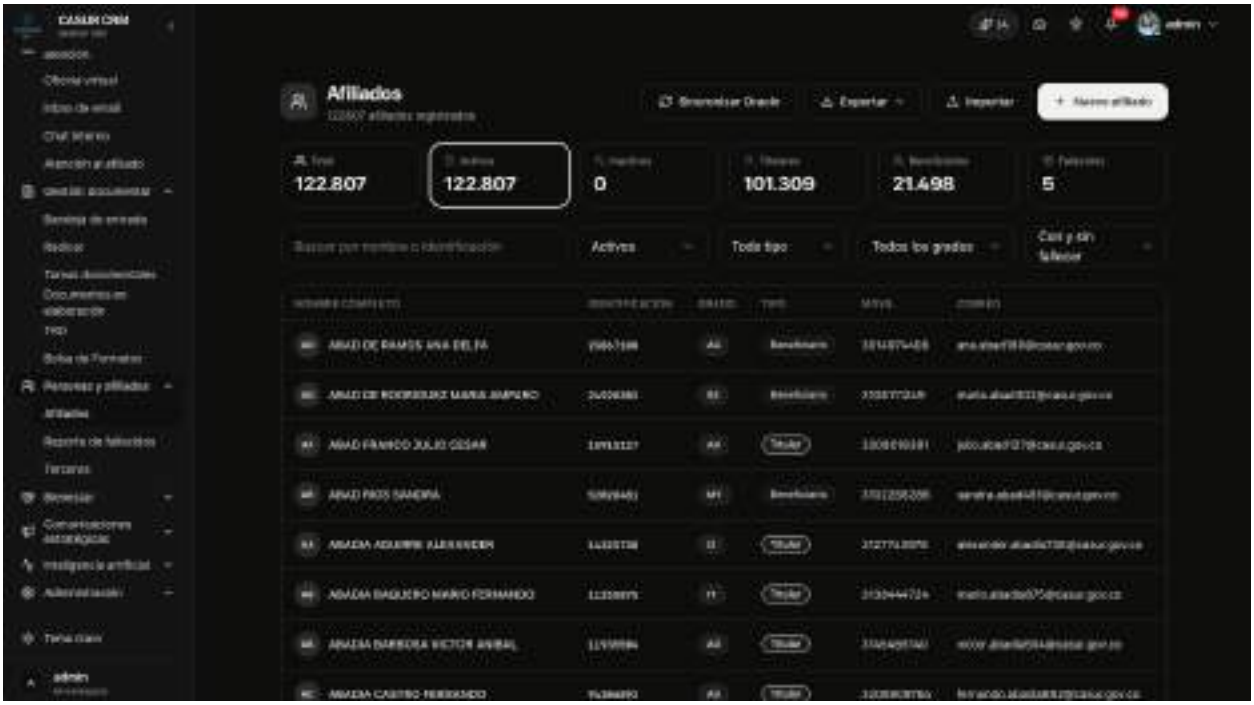

Base maestra de afiliados de la entidad con sincronización desde Oracle.

Hitos alcanzados:

- 122.807 afiliados registrados: 101.309 titulares y 21.498 beneficiarios, con 0 inactivos y 5 fallecidos identificados.
- Exportación, importación y sincronización con el sistema Oracle, además de búsqueda por nombre, identificación, grado y tipo.

14. Personas y afiliados — Reporte de fallecidos




Tablero de control de población, pagos posteriores y seguimiento de casos de fallecimiento.

Hitos alcanzados:

- Alertas automáticas de casos que requieren revisión (3 casos con pagos posteriores pendientes por un total de $9.545.000).
- Visualización de la composición de la población (vivos vs. fallecidos) y de fallecimientos por mes.

15. Personas y afiliados — Terceros

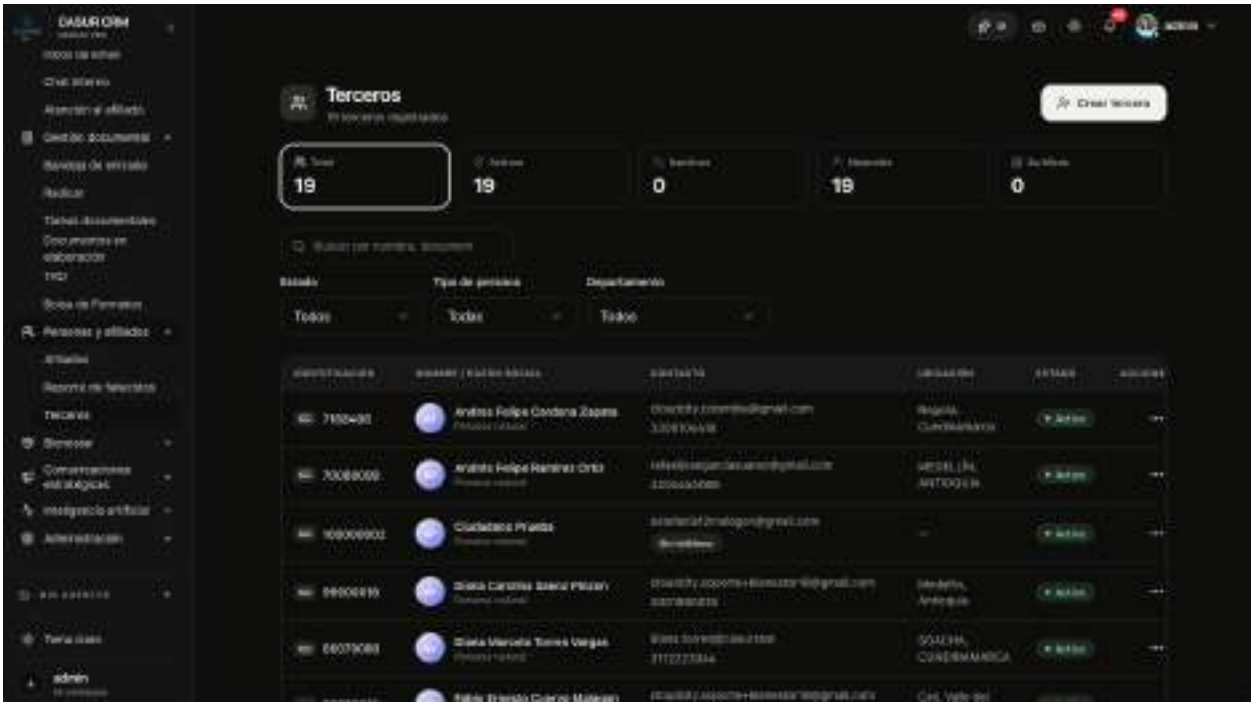

Registro de personas naturales o jurídicas externas vinculadas a los trámites de la entidad.

Hitos alcanzados:

- Estructura lista para la creación y filtrado de terceros por estado y tipo de persona.

16. Bienestar — Tablero



Panel integral de actividades, asistencia, satisfacción y ejecución presupuestal del área de bienestar.

Hitos alcanzados:

- Seguimiento de 5 actividades (3 finalizadas, 2 en curso) con 14 asistentes y 10 usuarios nuevos captados.
- Indicadores de satisfacción (5/5) y logística (4.5/5), con ejecución presupuestal del 70% ($3.500.000 pagados de $5.000.000 asignados).
- Análisis de cobertura territorial por departamento y modalidad (presencial/virtual).

17. Bienestar — Programas




Catálogo de programas de bienestar social con sus definiciones y contratistas a cargo.

Hitos alcanzados:

- 10 programas de bienestar activos (Acompañamiento psicosocial, Adulto mayor, Cultura y arte, Educación y capacitación, Emprendimiento, Familia, entre otros).

18. Bienestar — Actividades

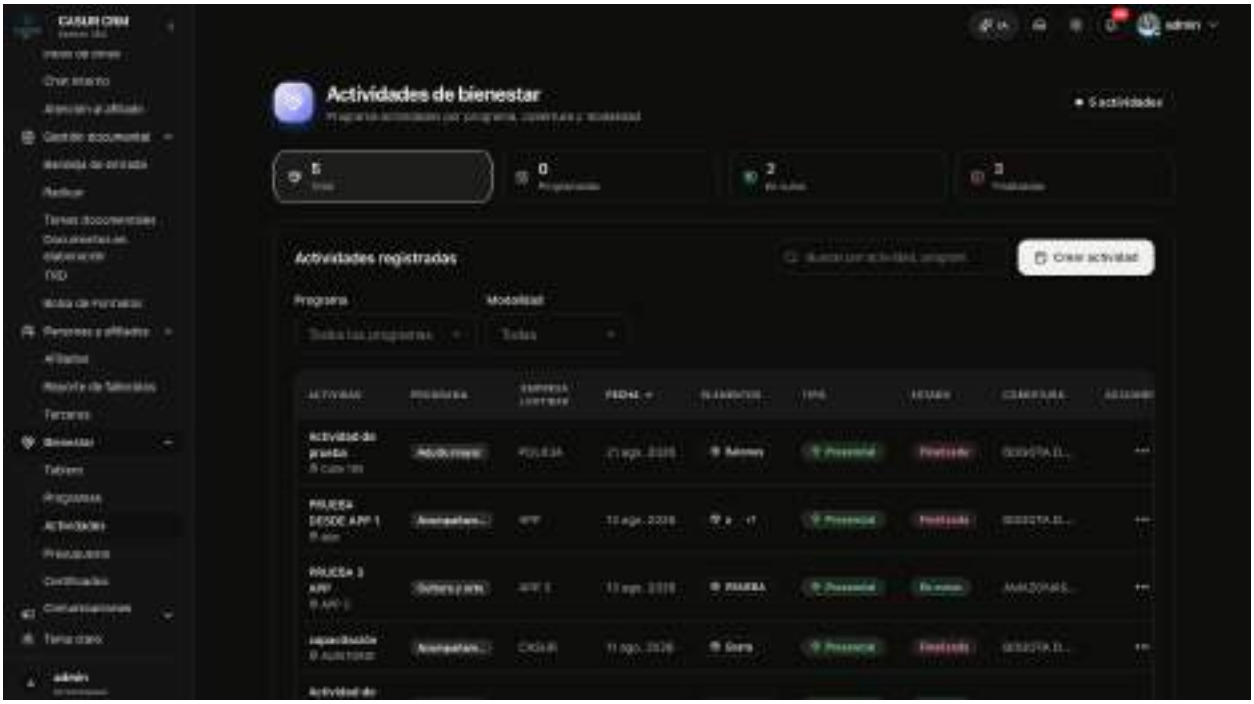


Programación de actividades de bienestar por cobertura, modalidad y estado.

Hitos alcanzados:

- 5 actividades registradas con trazabilidad de tipo, elementos, empresa/entidad participante y cobertura geográfica.

19. Bienestar — Presupuesto

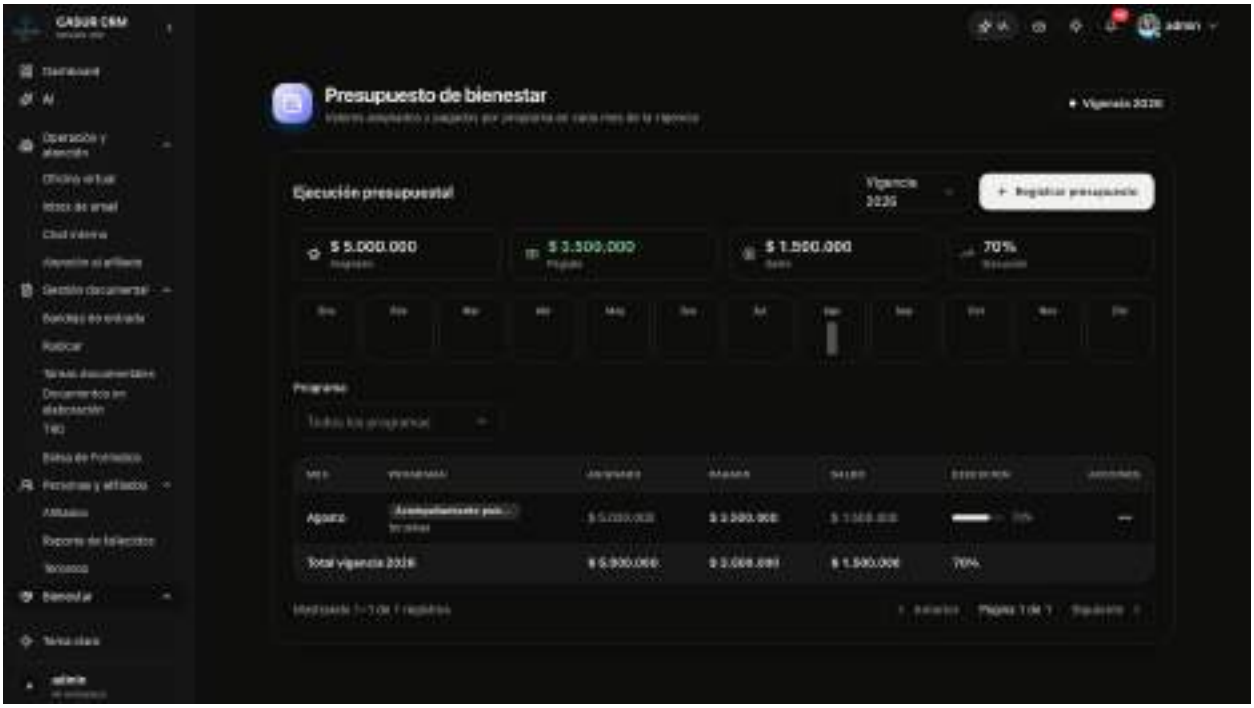

Control de ejecución presupuestal por programa y por mes de la vigencia.

Hitos alcanzados:

- Vigencia 2026 con $5.000.000 asignados, $3.500.000 pagados y $1.500.000 de saldo disponible (70% de ejecución).

20. Bienestar — Certificados




Diseñador visual de la plantilla de certificado de reconocimiento entregado a los participantes de las actividades.

Hitos alcanzados:

- Personalización completa del encabezado, textos y vista previa en tiempo real del certificado institucional con escudo y colores de CASUR.

21. Comunicaciones estratégicas — Tablero

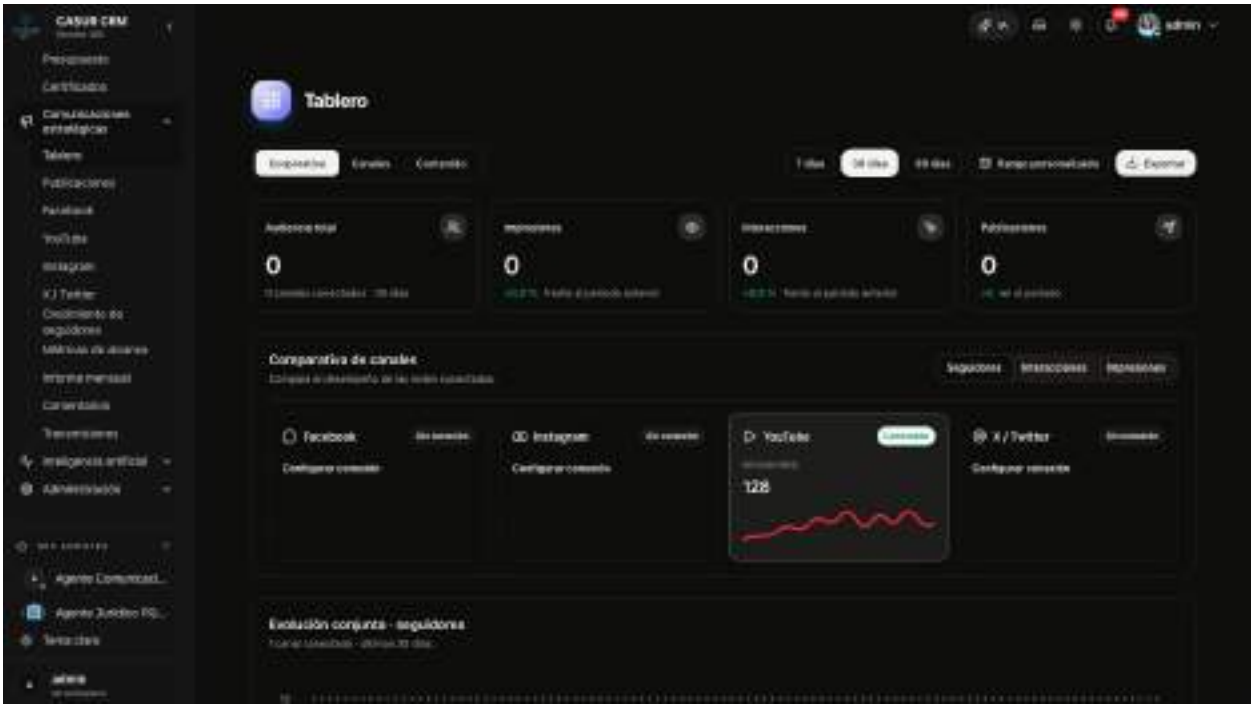


Panel de gestión de redes sociales y comunicación externa institucional.

Hitos alcanzados:

- Comparativa de canales conectados (Facebook, Instagram, YouTube, X/Twitter), con YouTube activo y 128 seguidores.
- Métricas de audiencia, impresiones, interacciones y publicaciones consolidadas en un solo tablero, con exportación de reportes.

22. Inteligencia artificial — Agentes IA

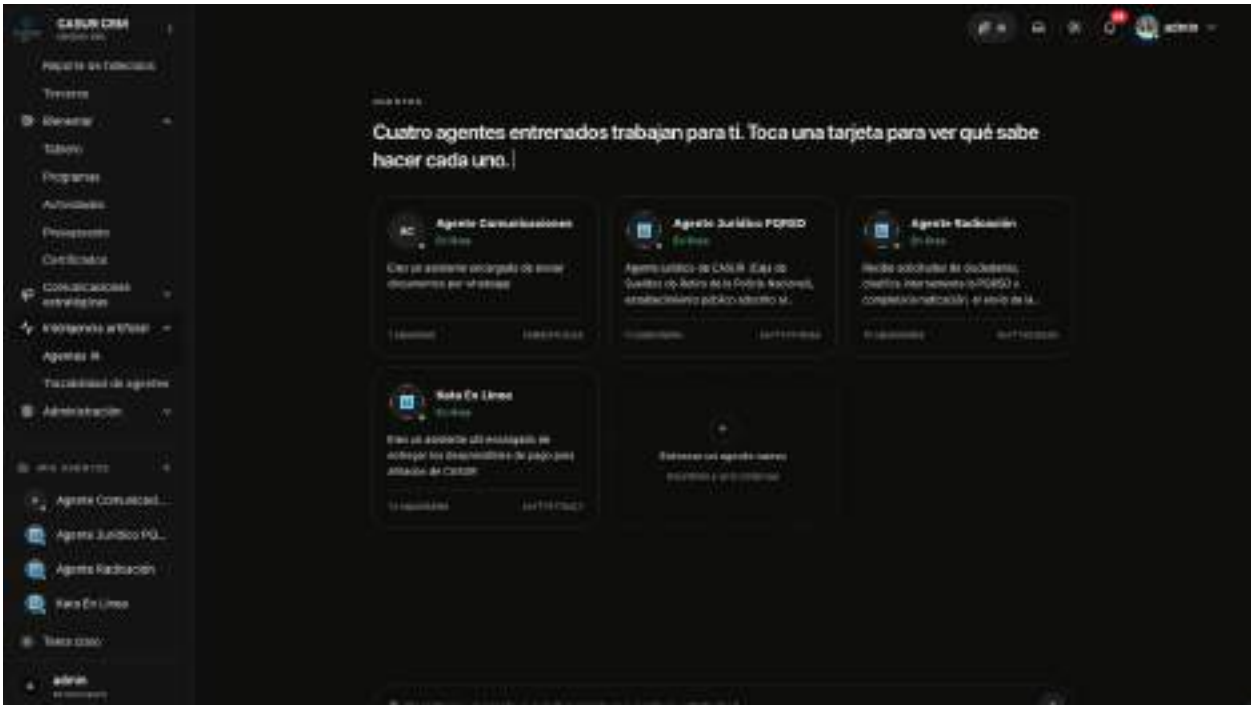


Panel de administración de los agentes de IA entrenados para la entidad.

Hitos alcanzados:

- 4 agentes especializados en operación: Agente Comunicaciones (envío de documentos por WhatsApp), Agente Jurídico PQRSD, Agente Radicación (15 capacidades, clasificación y radicación de PQRSD) y Kata en Línea (entrega de desprendibles de pago).
- Funcionalidad de creación de nuevos agentes mediante lenguaje natural ('Entrenar un agente nuevo').

23. Inteligencia artificial — Trazabilidad de agentes

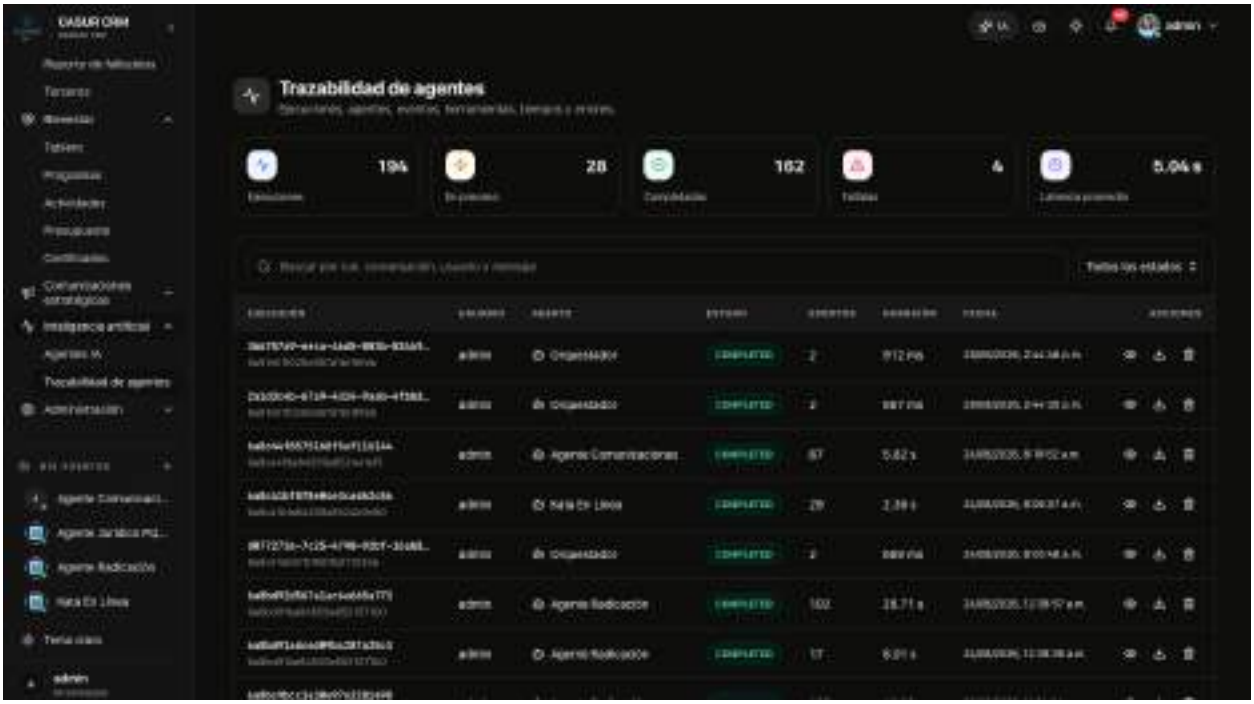


Bitácora de ejecuciones de los agentes de IA con eventos, herramientas, tiempos y errores.

Hitos alcanzados:

- 194 ejecuciones registradas: 162 completadas, 28 en proceso y 4 fallidas, con una latencia promedio de 5.04 segundos.
- Detalle por ejecución (usuario, agente, duración, eventos) con posibilidad de descarga individual.

24. Administración — Funcionarios

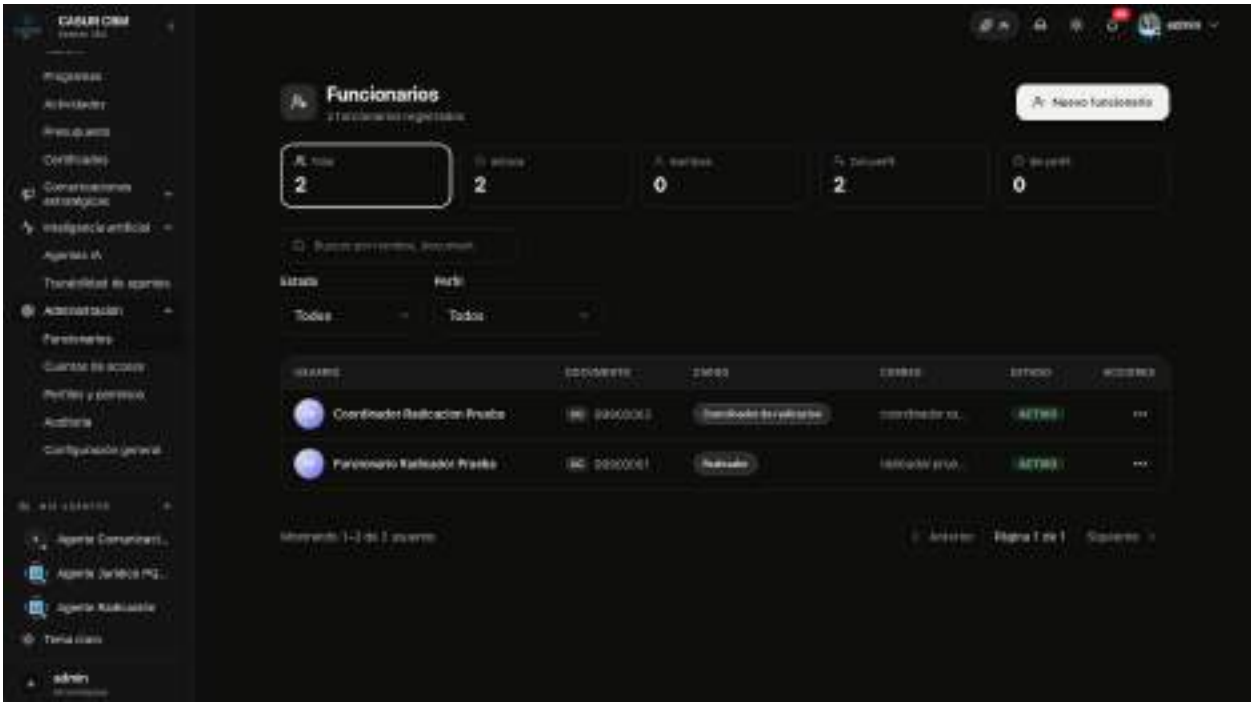

Gestión de los funcionarios registrados en el sistema, con su cargo y estado.

Hitos alcanzados:

- 2 funcionarios activos con perfil asignado (Coordinador de Radicación y Radicador).

25. Administración — Cuentas de acceso




Administración de credenciales, perfiles y estado de las cuentas del sistema.

Hitos alcanzados:

- 5 cuentas registradas y activas, cada una asociada a un perfil de seguridad (Admin, Coordinador, Funcionario, Radicador, Coordinador Radicación), con registro del último acceso.

26. Administración — Perfiles y permisos

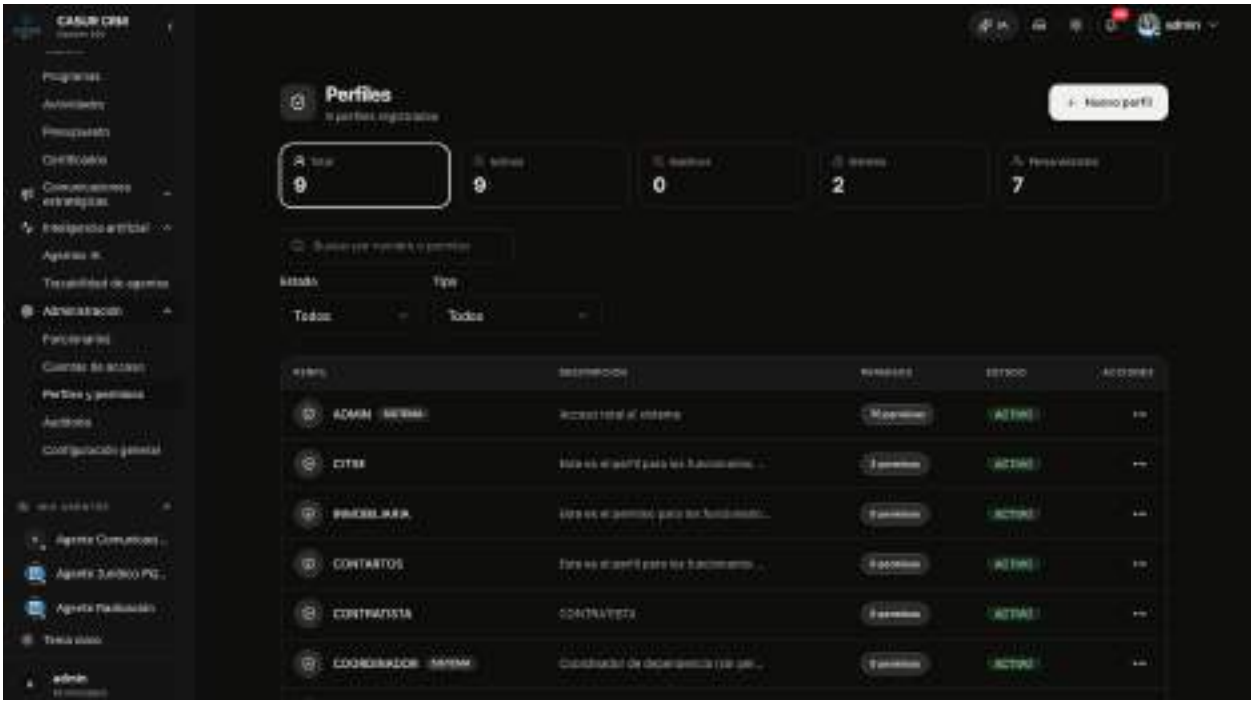


Configuración de perfiles de seguridad y sus permisos asociados.

Hitos alcanzados:

- 9 perfiles registrados (2 de sistema y 7 personalizados), todos activos, con el perfil ADMIN otorgando acceso total (70 permisos).

27. Administración — Auditoría

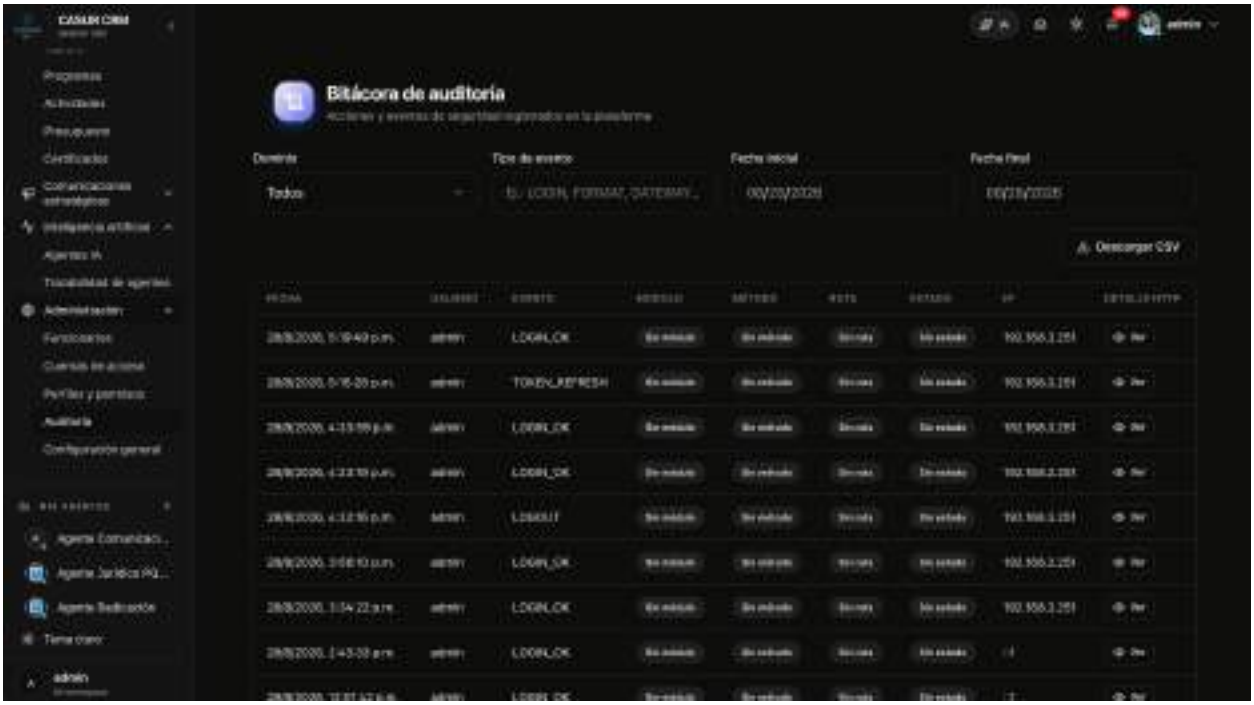


Bitácora de auditoría de acciones y eventos de seguridad de la plataforma.

Hitos alcanzados:

- Registro detallado por fecha, usuario, evento (LOGIN_OK, LOGOUT, LOGIN_FAIL), IP y detalle HTTP, con filtros por dominio, tipo de evento y rango de fechas, y exportación a CSV.

28. Administración — Configuración general

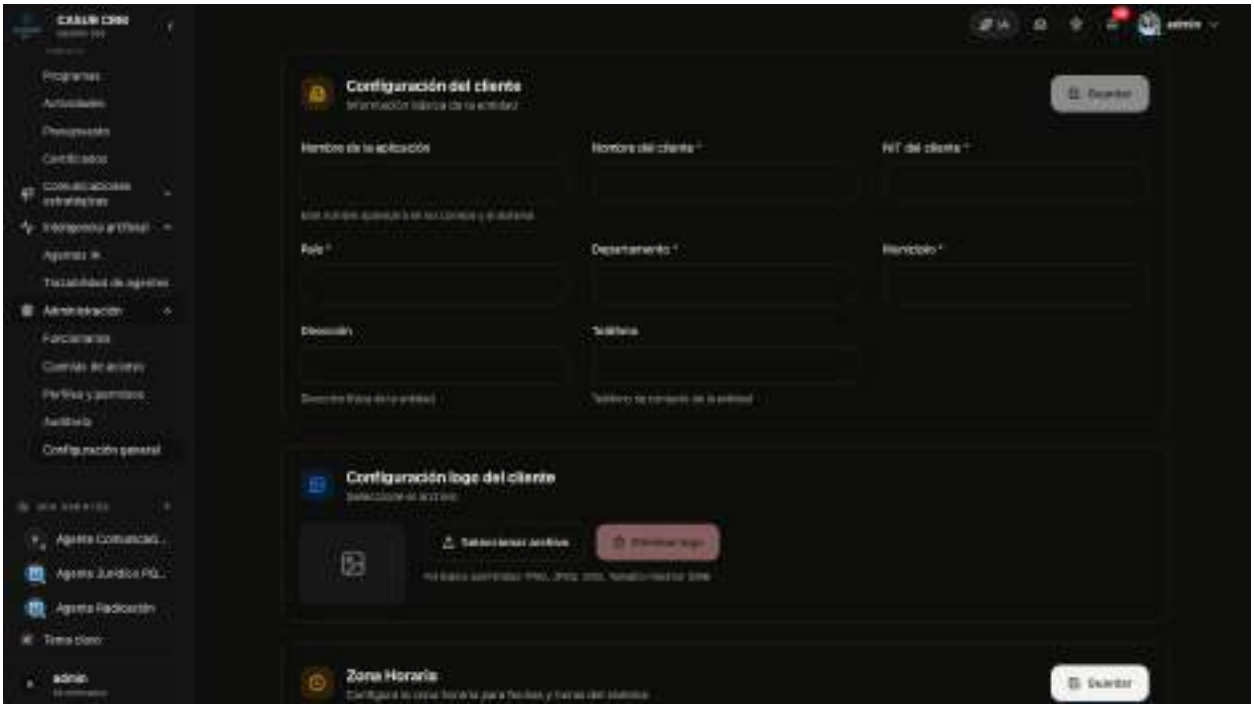

Parametrización institucional del cliente (nombre, NIT, ubicación, logo).

Hitos alcanzados:

- Formulario de configuración del cliente y carga de logo institucional, base para la personalización de la plataforma.

Por lo anterior se da por cumplido todos los ítems que corresponden al periodo de AGOSTO según el cronograma establecido en el proyecto.

Atentamente:

JONATHAN DAVID LUNA
Cédula de Ciudadanía No. **1.073.706.360 Soacha**
En Calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**
Empresa: **CLOUD CITY COLOMBIA SAS**
Nit: **901.249.716-3**
Email: **info@cloudcity.com.co**
Website: **www.cloudcitycolombia.com**
Tel: **(318) 201-1697**

Dirección: **Cra.42 # 22A-23 OF 402 Edificio BTU**
Ciudad: **Bogotá**
